

**LAPORAN PROYEK AKHIR**  
**WORKSHOP MANAJEMEN PROYEK**



**VISIMALA DESKTOP**

Disusun Oleh :

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>SATRIA ARDIANTHA UNO</b>     | <b>(E41230299)</b> |
| <b>WILLY ADIMASTHA NUGROHO</b>  | <b>(E41230144)</b> |
| <b>MUHAMMAD DANIEL UMAR</b>     | <b>(E41230181)</b> |
| <b>MOH. HABIBURROHMAN</b>       | <b>(E41230411)</b> |
| <b>KHOLIFATIN KHOIRIYAH</b>     | <b>(E41230118)</b> |
| <b>CHIQUITA CLAIRINA KYREVI</b> | <b>(E41230019)</b> |

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JEMBER**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
**POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

**2024**

# DAFTAR ISI

Halaman

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI.....                                         | i   |
| DAFTAR GAMBAR .....                                     | iii |
| DAFTAR TABEL .....                                      | v   |
| BAB I INISIASI PROYEK.....                              | 1   |
| 1.1          Info Umum.....                             | 1   |
| 1.2          Pembahasan Produk.....                     | 1   |
| 1.3          Deskripsi Produk.....                      | 2   |
| 1.4          Hasil yang diinginkan .....                | 5   |
| 1.5          Teknologi yang digunakan .....             | 6   |
| 1.6          Batasan .....                              | 10  |
| 1.7          Faktor Penentu Keberhasilan .....          | 10  |
| 1.8          Keuntungan yang diharapkan.....            | 11  |
| 1.9          Jadwal .....                               | 11  |
| 1.10         Perencanaan Aktivitas Secara Umum.....     | 12  |
| 1.11         Resiko .....                               | 12  |
| 1.12         Asumsi .....                               | 13  |
| 1.13         Estimasi Biaya dan Sumber Daya.....        | 13  |
| 1.14         Estimasi Sumber Daya yang diperlukan ..... | 14  |
| BAB II PERENCANAAN PROYEK .....                         | 16  |
| 2.1          Desain Print .....                         | 16  |
| 2.2          Prototype.....                             | 17  |
| 2.3          PBI.....                                   | 25  |
| 2.4          Jadwal Proyek .....                        | 33  |
| BAB III PELAKSANAAN PROYEK .....                        | 35  |
| 3.1          Design Sprint.....                         | 35  |
| 3.2          Product Backlog.....                       | 37  |
| 3.3          Inkremen 1 .....                           | 38  |
| 3.4          Inkremen 2 .....                           | 40  |
| 3.5          Inkremen 3 .....                           | 42  |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| BAB IV KONTROL PROYEK DAN HASIL PENGUJIAN PBI ..... | 44 |
| 4.1 Project Management Plan .....                   | 44 |
| 4.2 Catatan Pertemuan/Rapat Ke-1 .....              | 44 |
| 4.3 Catatan Pertemuan Rapat Ke-2 .....              | 45 |
| 4.4 Catatan Pertemuan Rapat Ke-3 .....              | 46 |
| 4.5 Catatan Pertemuan Rapat Ke-4 .....              | 47 |
| 4.6 Catatan Pertemuan Rapat Ke-5 .....              | 48 |
| 4.7 Catatan Pertemuan Rapat Ke-6 .....              | 49 |
| 4.8 Catatan Pertemuan Rapat Ke-7 .....              | 50 |
| 4.9 Catatan Pertemuan Rapat Ke-8 .....              | 51 |
| 4.10 Catatan Pertemuan Rapat Ke-9 .....             | 52 |
| 4.11 Catatan Pertemuan Rapat Ke-10 .....            | 53 |
| 4.12 Kemajuan Proyek .....                          | 55 |
| BAB V PENUTUP .....                                 | 59 |
| 5.1 Kesimpulan .....                                | 59 |
| 5.2 Saran .....                                     | 59 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                          | Halaman |
|------------------------------------------|---------|
| Gambar 2.1 Design Sprint Dashboard ..... | 16      |
| Gambar 2.2 Design Sprint Table.....      | 16      |
| Gambar 2.3 Design Sprint Dashboard ..... | 16      |
| Gambar 2.4 Absensi .....                 | 17      |
| Gambar 2.5 Absensi .....                 | 17      |
| Gambar 2.6 Login .....                   | 17      |
| Gambar 2.7 Register.....                 | 18      |
| Gambar 2.8 Reset Password.....           | 18      |
| Gambar 2.9 Reset Password.....           | 18      |
| Gambar 2.10 Reset Passsword .....        | 19      |
| Gambar 2.11 Manajemen Laundry .....      | 19      |
| Gambar 2.12 Tambah Pengeluaran .....     | 19      |
| Gambar 2.13 Edit Pengeluaran .....       | 20      |
| Gambar 2.14 Tabel Pengeluaran .....      | 20      |
| Gambar 2.15 Edit Produk.....             | 20      |
| Gambar 2.16 Tambah Produk .....          | 21      |
| Gambar 2.17 Tabel Produk .....           | 21      |
| Gambar 2.18 Transaksi .....              | 21      |
| Gambar 2.19 Tabel Transaksi .....        | 22      |
| Gambar 2.20 Tabel User .....             | 22      |
| Gambar 2.21 Tabel User .....             | 22      |
| Gambar 2.22 Daftar Deposit .....         | 23      |
| Gambar 2.23 Table Deposit .....          | 23      |
| Gambar 2.24 Riwayat Deposit .....        | 23      |
| Gambar 2.25 Tambah Rak .....             | 24      |
| Gambar 2.26 Lemari Laundry .....         | 24      |
| Gambar 2.27 Lemari Laundry .....         | 24      |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Gambar 2.28 Laporan Keuangan ..... | 25 |
|------------------------------------|----|

## DAFTAR TABEL

|                                               | Halaman |
|-----------------------------------------------|---------|
| Tabel 1.1 Inisiasi Proyek.....                | 1       |
| Tabel 1.2 Jadwal Proyek .....                 | 11      |
| Tabel 1.3 Perencanaan Aktivitas.....          | 12      |
| Tabel 1.4 Anggaran Biaya.....                 | 13      |
| Tabel 2.1 PBI .....                           | 25      |
| Tabel 2.2 Jadwal Proyek .....                 | 33      |
| Tabel 3.1 Understanding .....                 | 35      |
| Tabel 3.2 Deciding .....                      | 36      |
| Tabel 3.3 Validating.....                     | 37      |
| Tabel 3.4 Product Backlog.....                | 37      |
| Tabel 3.5 Sprint Planning Inkremen 1 .....    | 38      |
| Tabel 3.6 Sprint Review Inkremen 1 .....      | 39      |
| Tabel 3.7 Sprint Planning Inkremen 2 .....    | 40      |
| Tabel 3.8 Sprint Review Inkremen 2 .....      | 41      |
| Tabel 3.9 Sprint Planning Inkremen 3 .....    | 42      |
| Tabel 3.10 Sprint Review Inkremen 3 .....     | 43      |
| Tabel 4.1 Daftar Rencana Proyek .....         | 45      |
| Tabel 4.2 Daftar Rencana Kegiatan .....       | 46      |
| Tabel 4.3 Daftar Rencana Kegiatan .....       | 47      |
| Tabel 4.4 Daftar Rencana Kegiatan .....       | 48      |
| Tabel 4.5 Daftar Rencana Kegiatan .....       | 49      |
| Tabel 4.6 Daftar Rencana Kegiatan .....       | 50      |
| Tabel 4.7 Daftar Rencana Kegiatan .....       | 51      |
| Tabel 4.8 Daftar Rencana Kegiatan .....       | 52      |
| Tabel 4.9 Daftar Rencana Kegiatan .....       | 53      |
| Tabel 4.10 Daftar Rencana Kegiatan .....      | 54      |
| Tabel 4.11 Kemajuan Proyek Design Sprint..... | 55      |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Tabel 4.12 Kemajuan Proyek Inkremen 1 ..... | 56 |
| Tabel 4.13 Kemajuan Proyek Inkremen 2 ..... | 57 |
| Tabel 4.14 Kemajuan Proyek Inkremen 3 ..... | 58 |

# BAB I

## INISIASI PROYEK

### 1.1 Info Umum

Tabel 1.1 Inisiasi Proyek

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama proyek :                  | Visimala Desktop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pemilik proyek :               | Vita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Manajer proyek/product owner : | Satria Ardiantha Uno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Deskripsi singkat :            | Aplikasi Laundry berbasis desktop ini dirancang untuk mengoptimalkan operasional usaha laundry, menawarkan solusi komprehensif untuk manajemen karyawan, keuangan, dan operasional. Dengan fitur absensi, pelaporan kinerja, pelacakan keuangan real-time, dan analisis mendalam, aplikasi ini membantu pemilik usaha membuat keputusan yang informasi untuk menjaga kesehatan finansial. Fitur otomatisasi seperti penjadwalan pengiriman, pelacakan inventaris, dan laporan keuangan real-time, semakin memudahkan pengelolaan harian, meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan profitabilitas bisnis laundry. |
| Prodecessor :                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Successor :                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 1.2 Pembahasan Produk

Kami akan membahas mengenai produk yang kami buat, yaitu sebuah sistem informasi manajemen laundry. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan operasional bisnis laundry, mulai dari penerimaan cucian, pencatatan jenis layanan yang dipilih pelanggan, hingga pengelolaan inventaris dan keuangan.



### 1.3 Deskripsi Produk

- 1) Register: Pada Fitur register dapat membuat pengguna baru dengan menginput username, alamat email, dan kata sandi. Pengguna juga dapat memilih peran sebagai owner atau pegawai. Jika tidak ada owner, pengguna yang mendaftar dapat memilih menjadi owner, jika sudah ada owner, maka akan menjadi pegawai secara otomatis.
- 2) Login: Pada fitur login terdapat username dan password yang mengharuskan penggunanya menginput username atau emailnya dan password sesuai dengan yang diinput dalam fitur register sebelumnya, dalam fitur ini juga terdapat fitur lupa password yang memungkinkan pengguna untuk mengatur ulang kata sandi dengan mengirimkan OTP terlebih dahulu ke email pengguna, apabila OTP yang di input pengguna terverifikasi, user bisa mengatur ulang kata sandinya.
- 3) Absensi: Fitur absensi memiliki dua jenis akses yaitu untuk owner dan pegawai. Pegawai dapat menggunakan fitur ini untuk menginput waktu masuk (time in) dan waktu pulang (time out). Sedangkan owner hanya bisa mengakses fitur ini untuk melihat data absensi dan merekapnya dalam bentuk pdf. Fitur absensi memiliki dua jenis akses: untuk owner dan pegawai. Pegawai dapat menggunakan fitur ini untuk menginput waktu masuk (time in) dan waktu pulang (time out). Selain itu, mereka juga dapat melihat sebuah kalender yang menampilkan tanggal-tanggal dimana mereka telah absen. Jika absen dilakukan pada suatu tanggal, tanggal tersebut akan ditandai dengan warna hijau di kalender. Sementara itu, fitur absensi untuk owner lebih berfokus pada melihat data absensi dan merekapnya dalam bentuk PDF. Data yang ditampilkan mencakup jumlah pegawai, jumlah yang hadir tepat waktu, jumlah yang terlambat, dan waktu real-time. Untuk Setting Batas Waktu keterlambatan bagi karyawan, hanya tersedia untuk owner di bagian setting menu utama.
- 4) User: Pada fitur user terdapat tabel user dan form user. Form user berfungsi untuk membuat user baru dan tabel user akan menampilkan

sejumlah user yang sudah pernah ditambahkan di form user atau register. Fitur ini hanya tersedia untuk user yang menjabat sebagai owner. Selain itu Owner juga bisa menghapus, mengedit, mencari, dan menampilkan detail user.

- 5) Deposit: suatu fitur yang digunakan untuk menyimpan aset dari pelanggan berupa saldo yang ada di dalam akun pelanggan itu sendiri dan bisa digunakan di dalam transaksi. Pelanggan bisa mendaftar untuk membuat akun deposit lalu pelanggan bisa mengisi saldo akun depositnya. Pada saat pelanggan melakukan transaksi, pelanggan bisa memilih fitur deposit dan apabila transaksi sudah selesai maka saldo dari deposit akan berkurang. Pelanggan bisa mengisi saldo melalui fitur Top Up agar bisa memanfaatkan fitur deposit kembali.
- 6) Transaksi: Fitur transaksi mencakup empat komponen tabel transaksi, form transaksi, detail transaksi, dan struk transaksi. Tabel transaksi berfungsi sebagai tampilan ringkas dari beberapa kolom data transaksi yang telah dimasukkan melalui form transaksi. Dalam form transaksi, pengguna dapat membuat entri transaksi baru dengan memasukkan informasi seperti data pelanggan, detail produk, tenggat waktu dan tanggal pengambilan laundry, serta total pembayaran dan kembalian laundry. Fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk menambahkan catatan tambahan terkait laundry, dan jika klien meminta pengiriman, alamat pengiriman dapat dimasukkan dalam form transaksi. Detail transaksi menyajikan seluruh detail informasi mengenai suatu transaksi, memungkinkan pengguna untuk melihatnya dengan lebih rinci. Selain itu, fitur transaksi juga menyediakan opsi untuk mencetak struk laundry, memberikan bukti yang jelas kepada pelanggan mengenai transaksi yang telah dilakukan.
- 7) Produk: Fitur Produk adalah sebuah fitur yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengelola informasi terkait produk yang ditawarkan. Fitur ini memiliki dua halaman utama, yakni Form dan Tabel. Halaman Form dirancang agar pengguna dapat mengisi data

terkait produk dengan mudah. Di halaman ini, pengguna dapat memasukkan informasi seperti nama produk, deskripsi (jenis produk), harga, dan atribut lainnya yang relevan. Form ini disusun secara intuitif untuk memastikan pengguna dapat mengisi data dengan cepat dan akurat. Sementara itu, halaman Tabel digunakan untuk menampilkan data produk setelah pengisian form. Tabel ini memberikan gambaran yang jelas mengenai semua produk yang telah dimasukkan, termasuk informasi-informasi penting seperti nama produk, deskripsi, harga, dan lain sebagainya.

- 8) **Pengeluaran:** Fitur ini menyediakan informasi yang terperinci mengenai berbagai biaya yang dikeluarkan. Pengguna bisa mencatat informasi mengenai pengeluaran dari usaha laundry berupa tanggal pengeluaran, keterangan untuk informasi yang lebih rinci misalnya pembelian bahan baku dan jumlah keseluruhan dari pengeluaran pada keterangan yang dicantumkan.
- 9) **Laporan Keuangan:** Fitur laporan keuangan ini memberikan kemampuan untuk menyajikan data pemasukan, pengeluaran, dan perhitungan laba rugi dalam satu tabel laporan. Data dari pemasukan berasal dari keseluruhan aktivitas transaksi yang terjadi. Sedangkan pada data pengeluaran berasal dari seluruh aktivitas pengeluaran dimana kedua data tersebut akan dihitung laba rugi-nya berdasarkan tanggal transaksi maupun tanggal pengeluaran. Terdapat dua pilihan untuk cetak PDF yaitu: untuk pilihan pertama didasarkan pada rentang waktu tertentu, sedangkan pilihan kedua didasarkan pada bulan dan tahun. Dalam format PDF untuk rentang waktu, cetakan hanya dapat dilakukan jika rentang waktu yang dipilih telah berlalu setidaknya 7 hari hingga maksimal 365 hari sejak pembuatan dokumen tersebut. Ketika memilih rentang waktu per bulan dan tahun, dokumen akan menampilkan tahun dan bulan yang dipilih oleh pengguna. Setelah proses pencetakan selesai, pengguna akan diberikan opsi untuk memilih lokasi penyimpanan yang diinginkan untuk menyimpan file

PDF yang telah dicetak. Dengan demikian, pengguna memiliki kendali penuh atas dokumentasi dan analisis keuangan, serta dapat memilih format yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

10) Stash Laundry: Fitur Stash Laundry adalah sebuah fitur yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengelola penyimpanan laundry. Fitur ini menawarkan sebuah halaman utama yang berisi sekumpulan lemari virtual, yang disusun dalam urutan seperti Lemari 1, Lemari 2, dan seterusnya. Setiap lemari dilengkapi dengan lampu indikator berwarna hijau dan merah untuk memberikan informasi tentang status lemari. Lampu hijau menandakan bahwa lemari tersebut penuh atau sudah terisi, sementara lampu merah menandakan bahwa lemari tersebut kosong atau belum terisi. Hal ini membantu pengguna untuk dengan cepat mengetahui ketersediaan tempat penyimpanan laundry. Selain itu, Fitur Stash juga dilengkapi dengan fitur History, yang memungkinkan pengguna untuk melihat riwayat transaksi penyimpanan laundry. Ketika pengguna mengklik salah satu lemari, misalnya Lemari 1, Fitur Stash akan menampilkan tabel yang berisi 10 atau lebih transaksi teratas yang terjadi pada lemari tersebut. Data ditampilkan mulai dari yang terbaru hingga yang terlama untuk memudahkan pengguna dalam melacak jejak penyimpanan laundry. Dari halaman History, pengguna dapat mencetak sebuah tabel lemari sebagai bukti atau catatan mengenai penyimpanan laundry mereka. Proses pencetakan tabel lemari dapat dilakukan dengan mengklik baris yang diinginkan pada tabel transaksi, lalu memilih opsi Print. Ini memungkinkan pengguna untuk memiliki dokumentasi yang jelas mengenai letak penyimpanan laundry mereka dan informasi lain yang relevan.

#### **1.4 Hasil yang diinginkan**

Untuk meningkatkan produktivitas dari usaha laundry, aplikasi ini menawarkan sejumlah kelebihan diantaranya:

1. Absensi Karyawan yang Efektif : sistem absensi memungkinkan pemantauan waktu masuk dan keluar karyawan dengan mudah, sementara fitur kalender memberikan visibilitas yang jelas tentang kehadiran karyawan.
2. Fleksibilitas dalam Transaksi dan Produk : fitur produk bisa memberikan penawaran yang menarik bagi pelanggan yang melakukan transaksi.
3. Manajemen Keuangan yang Akurat dengan Laporan Keuangan: laporan keuangan akan mencatat data pemasukan dan pengeluaran dimana akan memberikan kemampuan kepada pengguna untuk mencatat dan menganalisis semua biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diterima.
4. Pengelolaan Penyimpanan Laundry : Fitur Stash Laundry memudahkan pengguna dalam mengelola penyimpanan laundry dengan memantau ketersediaan ruang penyimpanan.

## **1.5 Teknologi yang digunakan**

### **A. Software**

1. IDE Netbeans: Integrated Development Environment (IDE) yang bersifat open source untuk pengembangan aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti Java, PHP, C++, dan lainnya. IDE ini memudahkan pengembangan aplikasi web, enterprise, desktop, dan mobile yang menggunakan platform Java dan HTML5. NetBeans juga menyediakan dukungan untuk pengembangan aplikasi PHP dan C/C++. NetBeans berjalan di atas Swing, yang merupakan teknologi yang memungkinkan pengembangan aplikasi desktop yang dapat beroperasi di berbagai platform seperti Windows, Mac OS, Linux, dan Solaris. Selain itu, NetBeans menyediakan berbagai alat seperti Graphic User Interface (GUI) builder, editor kode, compiler, dan debugger yang membantu mempercepat dan mempermudah proses pengembangan.

2. MySQL: sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System - RDBMS) yang menggunakan Structured Query Language (SQL). MySQL sering digunakan sebagai bagian dari stack LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python) untuk pengembangan aplikasi web. Sistem ini kompatibel dengan berbagai platform, termasuk Linux, Windows, OS X, dan lainnya, menjadikannya pilihan yang fleksibel untuk pengembangan lintas platform.
3. Apache: web server gratis dan open source yang memungkinkan pengguna untuk meng-host website di internet. Cara kerja Apache adalah dengan menerima permintaan dari browser pengguna dan mengirimkan respons berupa komponen-komponen halaman web yang diminta. Apache dapat menangani permintaan HTTP dan menyajikan halaman web, gambar, dan konten lainnya ke perangkat pengguna. Ini merupakan bagian penting dari stack LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python), yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Apache memiliki beberapa modul yang dapat menambah fungsionalitasnya, seperti MPM yang menangani berbagai mode multi-processing. Ini memungkinkan Apache untuk menjadi sangat fleksibel dan dapat dikonfigurasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hosting web.
4. Laragon: aplikasi yang digunakan untuk membuat program atau aplikasi di server lokal (komputer) dengan fitur yang lebih lengkap dibanding aplikasi lain dan kemudahan penggunaannya berkat tampilan GUI. Dengan Laragon, kita dapat membuat aplikasi dengan Git, dan mengelola databasenya menggunakan PHPMyAdmin. Laragon juga mendukung pembuatan aplikasi berbasis Node.js/MongoDB, Python/Django/Flask/Postgre, Ruby, Java, atau Go. Menariknya lagi, Laragon dapat digunakan di berbagai OS, mulai dari Windows, MacOS, hingga Linux. Laragon sudah menyertakan PHP dan engine database seperti MySQL atau

MariaDB. Setelah aplikasi selesai dibuat, kita dapat melakukan debugging atau menjalankan aplikasi melalui terminal yang disediakan. Laragon memiliki fitur Pretty URL's, yang memungkinkan untuk mengakses project website melalui `app.test` sebagai ganti dari `localhost/app`. Selain itu, Laragon juga portabel, sehingga dapat dipindahkan ke disk lain, laptop lain, atau disinkronkan ke Cloud tanpa merusak sistem. Lingkungan Laragon terisolasi dengan OS kita, menjaga sistem tetap bersih, sementara proses operasinya mudah karena Laragon mengotomatiskan banyak konfigurasi yang rumit. Dengan dukungan penuh untuk Apache dan Nginx, Laragon cocok untuk membangun aplikasi web modern.

5. Github: platform hosting repositori Git berbasis cloud yang memungkinkan para pengembang untuk menyimpan, mengelola, melacak, dan mengontrol perubahan kode program. GitHub menggunakan sistem kontrol versi yang disebut Git, yang merupakan sistem kontrol versi terdistribusi yang memungkinkan banyak pengembang bekerja bersama pada proyek yang sama tanpa mengganggu pekerjaan satu sama lain. GitHub memudahkan kolaborasi antar pengembang dalam sebuah proyek dengan fitur seperti branching dan pull requests. Ini memungkinkan pengembang untuk mengusulkan perubahan dan meminta integrasi ke proyek utama. Selain itu, GitHub memungkinkan pengembang untuk melihat riwayat perubahan kode, menjadikannya alat yang kuat untuk kontrol versi. GitHub juga sering digunakan sebagai portofolio pengembang untuk menunjukkan proyek dan kontribusi mereka kepada calon pemberi kerja atau komunitas. Dengan integrasi yang luas dengan alat dan layanan lain, GitHub memudahkan pengembang dalam mengelola proyek. GitHub menawarkan repositori publik gratis dan opsi repositori privat untuk proyek pribadi. Antarmuka pengguna GitHub yang ramah

membuatnya mudah digunakan bahkan oleh pengembang yang kurang berpengalaman dengan Git.

6. PHPMYAdmin: aplikasi web open source yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP dan digunakan untuk mengelola database MySQL melalui antarmuka web. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi database seperti membuat, mengedit, dan menghapus database atau tabel, serta menjalankan perintah SQL tanpa perlu menggunakan baris perintah. PHPMYAdmin memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola database dengan mudah, termasuk operasi seperti menambahkan, mengedit, atau menghapus tabel. Selain itu, pengguna dapat menggunakan editor teks untuk menulis dan menjalankan perintah SQL. PHPMYAdmin juga memungkinkan pengguna untuk mengimpor data dari file dan mengekspor database ke berbagai format. Fitur manajemen pengguna memungkinkan pengaturan hak akses pengguna dan manajemen peran. Selain itu, alat ini menyediakan fitur untuk mengoptimalkan dan memelihara kesehatan database.

#### B. Hardware

1. RFID: RFID adalah singkatan dari Radio Frequency Identification, sebuah teknologi identifikasi otomatis yang menggunakan gelombang radio untuk menangkap data dari tag yang terpasang pada objek. Tag RFID berisi chip elektronik dan antena; chip menyimpan informasi digital, dan antena memungkinkan pengiriman dan penerimaan data dari tag ke pembaca RFID.
2. Printer Thermal: jenis printer yang menggunakan printhead yang dipanaskan untuk menghasilkan tulisan atau gambar pada permukaan media cetak atau kertas. Berbeda dengan printer konvensional, printer thermal tidak menggunakan tinta atau toner dalam proses mencetak. Sebagai gantinya, printer ini menggunakan



kertas khusus yang peka terhadap panas, yang disebut Kertas Thermal.

### **1.6 Batasan**

Selama pengembangan proyek, terdapat sejumlah batasan yang mempengaruhi jalannya proyek pengembangan aplikasi yakni sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya: Batasan utama dalam proyek ini adalah keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran.
2. Keterbatasan Pengalaman Pengguna: Pengguna mungkin memiliki tingkat pengalaman yang berbeda dalam memahami maupun menggunakan teknologi atau aplikasi.
3. Keterbatasan Waktu: Waktu yang terbatas dapat menjadi tantangan dalam memenuhi tenggat waktu pengembangan dan peluncuran aplikasi.
4. Integrasi Software dan Hardware : Aplikasi harus terintegrasi dengan Thermal Printer untuk mencetak struk dan data lemari laundry maupun dengan RFID untuk absensi karyawan.

### **1.7 Faktor Penentu Keberhasilan**

- 1) Kerjasama sesama anggota Developer Team dengan Product Owner dalam membangun fitur
- 2) Koordinasi antara Product Owner dengan Client dalam pengembangan aplikasi
- 3) Komunikasi yang efektif antar sesama anggota tim
- 4) Pengelolaan produk Backlog
- 5) Fleksibilitas dan Responsif terhadap perubahan
- 6) Penyesuaian sistem operasi



### 1.10 Perencanaan Aktivitas Secara Umum

Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan :

Tabel 1.3 Perencanaan Aktivitas

| No | Deskripsi Aktivitas | Jumlah Hari |
|----|---------------------|-------------|
| 1  | Product Backlog     | 7 hari      |
| 2  | Sprint Planning     | 4 hari      |
| 3  | Design Sprint       | 4 hari      |

### 1.11 Resiko

Resiko disini hanya pada resiko perubahan scope proyek, tidak membahas resiko-resiko proyek secara keseluruhan.

1. Perubahan Lingkup Proyek: Resiko utama adalah adanya terjadi perubahan dalam lingkup proyek yang dapat terjadi akibat perubahan kebutuhan atau preferensi pengguna atau ketidaksepakatan dalam interpretasi spesifikasi proyek.
2. Kesulitan Teknis: Selama pengembangan aplikasi, mungkin akan ada risiko terkait kesulitan teknis seperti integrasi sistem yang kompleks atau kebutuhan akan teknologi yang belum teruji.
3. Komunikasi yang Kurang Efektif: Ketidaksepakatan atau kebingungan dalam hal kebutuhan dan harapan proyek dapat terjadi karena kurangnya komunikasi yang efektif antara tim pengembang dan klien, yang membawa risiko.
4. Keterbatasan Sumber Daya: Risiko terkait keterbatasan sumber daya manusia atau keuangan yang dapat mempengaruhi jadwal dan kualitas proyek.

### 1.12 Asumsi

Berikut merupakan asumsi-asumsi proyek secara umum :

1. Kebutuhan pengguna akan beragam, mulai dari pemilik usaha laundry hingga karyawan dan pelanggan.
2. Proyek akan memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, waktu, dan anggaran.
3. Penyesuaian sistem operasi yang digunakan selama pengembangan aplikasi.
4. Integrasi antara software dengan hardware.

### 1.13 Estimasi Biaya dan Sumber Daya

Berikut merupakan estimasi biaya yang dikeluarkan selama pengembangan proyek:

Tabel 1.4 Anggaran Biaya

| NO                                     | URAIAN                                              | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp)   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|---------------------|
| <b>2.1</b>                             | <b>ADMINISTRASI KANTOR</b>                          |        |        |                   |                     |
| 2.1.1                                  | Operasional Kantor                                  |        |        |                   |                     |
| 1                                      | Telepon, Listrik, Air, Laptop, Internet dan Printer | LS     | 1      | 750.000,00        | 750.000,00          |
| <b>SUB JUMLAH (2.1.1)</b>              |                                                     |        |        |                   | <b>750.000,00</b>   |
| 2.1.2                                  | Alat Tulis Kantor                                   |        |        |                   |                     |
| 1                                      | Belanja Alat Tulis Kantor                           | Ls     | 1      | 250.000,00        | 250.000,00          |
| <b>SUB JUMLAH (2.1.2)</b>              |                                                     |        |        |                   | <b>250.000,00</b>   |
| <b>SUB JUMLAH 2.1 (2.1.1 + 2.1.2 )</b> |                                                     |        |        |                   | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>2.2</b>                             | <b>BIAYA MOBILITAS</b>                              |        |        |                   |                     |
| 1                                      | Biaya Perjalanan Menemui Pemilik Usaha Laundry      | Motor  | 3      | 100.000,00        | 300.000,00          |
| <b>SUB JUMLAH (2.2)</b>                |                                                     |        |        |                   | <b>300.000,00</b>   |
| <b>2.3</b>                             | <b>BIAYA DOKUMEN</b>                                |        |        |                   |                     |
| 1                                      | Laporan Pendahuluan                                 | Buku   | 3      | 100.000,00        | 300.000,00          |
| 2                                      | Laporan Antara                                      | Buku   | 3      | 100.000,00        | 300.000,00          |

|                                                                          |                                         |      |   |            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---|------------|---------------------|
| 3                                                                        | Laporan Akhir                           | Buku | 2 | 100.000,00 | 200.000,00          |
| 4                                                                        | Dokumen RP24                            | Buku | 2 | 150.000,00 | 300.000,00          |
| 5                                                                        | Softcopy semua Laporan (Flashdisk 2 TB) | Set  | 1 | 250.000,00 | 250.000,00          |
| <b>SUB JUMLAH (2.3)</b>                                                  |                                         |      |   |            | <b>1.350.000,00</b> |
| <b>JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (SUB JUMLAH : 2.1 +2.2 + 2.3 )</b> |                                         |      |   |            | <b>2.650.000,00</b> |

#### 1.14 Estimasi Sumber Daya yang diperlukan

Dalam melaksanakan proyek pengembangan aplikasi laundry berbasis desktop, maka memerlukan sejumlah sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, alat, dan perangkat keras. Berikut adalah gambaran mengenai sumber daya yang dibutuhkan:

##### 1) Sumber Daya Manusia:

- a. Product Owner: Bertanggung jawab atas visi dan arah pengembangan aplikasi, berinteraksi dengan pemangku kepentingan, dan menentukan kebutuhan produk.
- b. Scrum Master: Mengelola proses pengembangan menggunakan metodologi Scrum, memfasilitasi pertemuan tim, dan mengatasi hambatan yang muncul selama pengembangan.
- c. UI/UX Designer: Merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik, serta memastikan pengalaman pengguna yang optimal.
- d. Programmer: Bertanggung jawab atas implementasi fitur-fitur yang direncanakan, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi.

##### 2) Alat:

- a. Alat Tulis Kantor: Digunakan untuk dokumentasi proyek, seperti membuat spesifikasi aplikasi, menggambar wireframe, dan mencatat hasil pertemuan tim.

### 3) Software:

- a. IDE Netbeans: Digunakan sebagai lingkungan pengembangan terintegrasi untuk pengkodean dan pengembangan aplikasi berbasis Java.
- b. MySQL: Digunakan sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi, seperti data pelanggan, transaksi, dan karyawan.
- c. Apache: Digunakan sebagai server web untuk menjalankan aplikasi berbasis web.
- d. Laragon: Digunakan sebagai platform pengembangan lokal yang menyediakan server web, basis data, dan alat pengembangan lainnya.
- e. GitHub: Digunakan sebagai platform untuk kolaborasi pengembangan perangkat lunak, pengelolaan kode sumber, dan kontrol versi.
- f. PHPMyAdmin: Digunakan sebagai antarmuka web untuk mengelola basis data MySQL secara visual.

### 4) Hardware:


- a. RFID: Digunakan untuk mengidentifikasi karyawan yang akan masuk atau keluar jam kerja.
- b. Printer Thermal: Digunakan untuk mencetak struk transaksi dan data laundry.

## BAB II


### PERENCANAAN PROYEK

#### 2.1 Desain Print

Berikut merupakan hasil Design Sprint selama pengembangan proyek ini:



Gambar 2.1 Design Sprint Dashboard

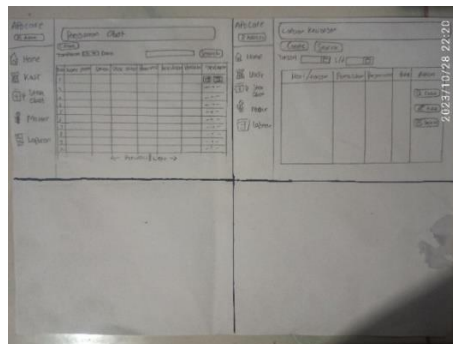


Gambar 2.2 Design Sprint Table




Gambar 2.3 Design Sprint Dashboard

## 2.2 Prototype


Berikut merupakan Prototype yang digunakan untuk tampilan dari proyek sistem informasi yang dikerjakan :

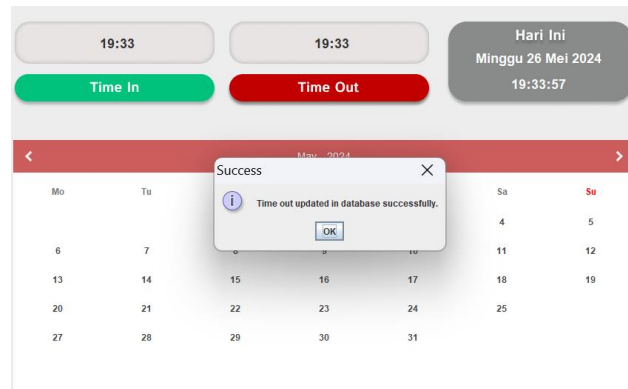

Gambar 2.4 Absensi

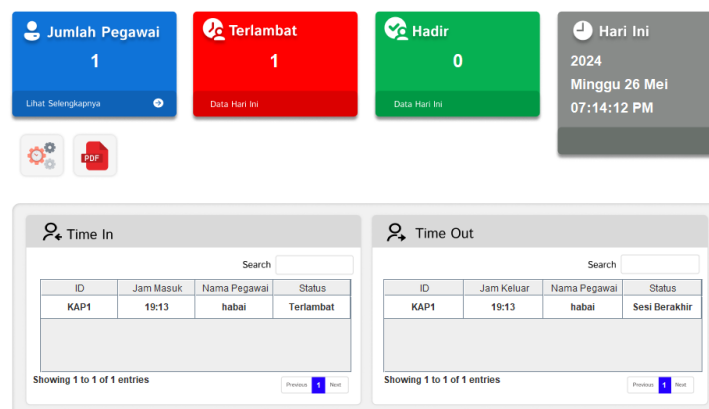

Gambar 2.5 Absensi



Gambar 2.6 Login





*Register*

Username

Email

Password


Confirm Password

Register

Login

*Selamat Bergabung*

Gambar 2.7 Register

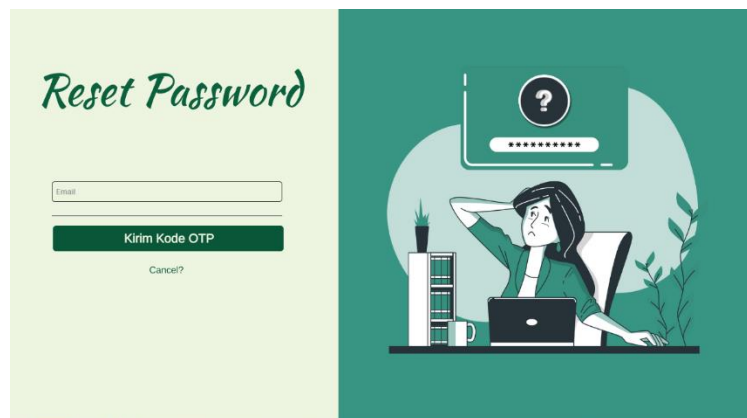


*Reset Password*

Email

Kirim Kode OTP

Cancel?

Gambar 2.8 Reset Password



*Reset Password*


000000

Kode verifikasi telah dikirimkan ke  
abijr130904@gmail.com.  
Silakan masukkan kode  
tersebut untuk melanjutkan.

00:10

Cancel?

Gambar 2.9 Reset Password

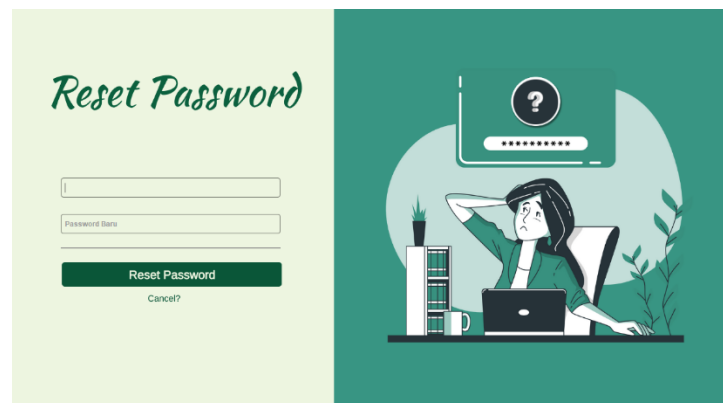

Gambar 2.10 Reset Passsword

|                                     |                                 |                                     |                           |                                    |                             |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| LEWAT<br>0<br>Pesanan lewat tenggat | SELESAI<br>0<br>Pesanan selesai | PROSES<br>0<br>Pesanan dalam proses | BARU<br>3<br>Pesanan baru | DIAMBIL<br>0<br>Sudah bisa diambil | DIKIRM<br>0<br>Perlu Dikirm |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|

| KODE | Nama Pelanggan | Pesanan | Jumlah | Status | Tenggat Waktu       | Action |
|------|----------------|---------|--------|--------|---------------------|--------|
| TR1  | g              | regular | 1 Kg   | Baru   | 2024-05-27 16:55:00 |        |
| TR2  | abi            | express | 1 Kg   | Baru   | 2024-05-27 00:50:00 |        |
| TR3  | abi            | regular | 1 Kg   | Baru   | 2024-05-27 18:54:00 |        |

Gambar 2.11 Manajemen Laundry

### Tambah Pengeluaran

Tanggal

Total

Catatan

Gambar 2.12 Tambah Pengeluaran



### Edit Pengeluaran

Tanggal

Total

Catatan

Gambar 2.13 Edit Pengeluaran

 **Tabel Pengeluaran**

| Id Pengeluaran | Tanggal    | Keterangan      | Total  | Action                                                                                             |
|----------------|------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN0001         | 2024-05-25 | beli bahan baku | 100000 | <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/> <input type="button" value="👁"/> |

Gambar 2.14 Tabel Pengeluaran



### Edit Produk

Nama Produk

Jenis Produk

Harga Produk

Batas Waktu

Gambar 2.15 Edit Produk



### Tambah Produk

Nama Produk

Jenis Produk

Harga Produk

Batas Waktu

Gambar 2.16 Tambah Produk

 **Tabel Produk** + ↺ 🔍

| Id Produk | Nama Produk | Harga Produk | Jenis Produk | Batas Hari | Batas Jam | Action                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------|--------------|--------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PR0002    | express     | 7000         | kiloan       | 0          | 6         |    |
| PR0003    | reguler     | 5000         | kiloan       | 1          | 0         |    |

Gambar 2.17 Tabel Produk

Member Depo  Tanggal Transaksi

Pelanggan

| Produk                                          | Jenis                | Harga                | Jumlah               | Total                |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text" value="-- Pilih Produk --"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**Detail Pesanan** 


| No | Nama    | Jenis  | Harga | Jumlah | Total Harga | Tenggat Waktu    |
|----|---------|--------|-------|--------|-------------|------------------|
| 1  | express | kiloan | 7000  | 1      | 7000        | 2024-05-27 00:50 |

Grand Total  Dibayar  ☐ Dikirim Ke Alamat

Pembayaran  Secara  Catatan


Kembalian

Gambar 2.18 Transaksi




| KODE | Pelanggan | Status Pembayaran | Total Bayar | Tanggal Pesanan     | Action |
|------|-----------|-------------------|-------------|---------------------|--------|
| TR1  | o         | Sudah Dibayar     | Rp.5000     | 2024-05-28 16:55:00 |        |
| TR2  | abi       | Sudah Dibayar     | Rp.7000     | 2024-05-28 18:50:00 |        |

Gambar 2.19 Tabel Transaksi



| Id User | Username | Password | Jabatan | Email          | No HP         | Alamat  | RFID Tag   | Action |
|---------|----------|----------|---------|----------------|---------------|---------|------------|--------|
| UID1    | habi     | 111111   | owner   | abijr130904... | 024834787     | jemaber | 1392640384 |        |
| UID2    | dami     | 222222   | pegawai | gymwo@gm...    | 0856791987... | jemeber | 3611468288 |        |

Gambar 2.20 Tabel User



**Daftar Pelanggan**

**Nama**

**Nomor Hp**

**Alamat**

jLabel2



Gambar 2.21 Tabel User



### Daftar Deposit

Nama

No Hp

Saldo

Alamat

Gambar 2.22 Daftar Deposit



### Tabel Deposit




| ID Deposit | Nama | Nomor HP     | Saldo  |
|------------|------|--------------|--------|
| DPT001     | habi | 085878990267 | 100000 |
|            |      |              |        |

Gambar 2.23 Table Deposit



### Riwayat Deposit

| Waktu Deposit       | Nama | Keterangan     | Saldo  |
|---------------------|------|----------------|--------|
| 2024-05-26 21:22:03 | habi | Mendaftar Akun | 100000 |
| 2024-05-26 19:43:00 | abi  | Saldo Keluar   | 5000   |
| 2024-05-26 19:42:00 | abi  | Saldo Keluar   | 8000   |
| 2024-05-26 18:54:00 | abi  | Saldo Keluar   | 5000   |
| 2024-05-26 18:50:00 | abi  | Saldo Keluar   | 7000   |
| 2024-05-26 16:55:00 | g    | Saldo Keluar   | 5000   |
| 2024-05-26 14:56:00 | apah | Saldo Keluar   | 7000   |
| 2024-05-26 14:56:00 | apah | Saldo Keluar   | 7000   |

Gambar 2.24 Riwayat Deposit

RS03



### Tambahkan Rack

Nama Rack

Batas Penyimpanan

Jenis Rak

Jenis Produk

Gambar 2.25 Tambah Rak

#### Rack Satuan

☐

☐

#### Rack Per Kilo

☐

☐

☐

Gambar 2.26 Lemari Laundry

| Kode Transaksi | Pelanggan | Jumlah Item | Status Laundry | Batas Waktu         | Aksi                             |
|----------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|----------------------------------|
| TR2            | hazbi     | 1           | Baru           | 2024-05-27 03:25:00 | <input type="button" value="↻"/> |

Gambar 2.27 Lemari Laundry

Gambar 2.28 Laporan Keuangan

### 2.3 PBI

Berikut merupakan hasil pembuatan Product Backlog Item:

Tabel 2.1 PBI

| No | PBI      | Acceptance Criteria |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keterangan                                                                          |
|----|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Register | ✓                   | a. Username : menggunakan namasesuai kebutuhan dari user<br>b. Email : alamat Emaildari user yang digunakan pada aplikasi<br>c. Password : kata sandi yang digunakan untuk mengamankan akun<br>d. No. Hp : menggunakan nomorHp dari user sebagai data tambahan<br>e. Register Button : apabila semua data telah dimasukkan maka selanjutnya dapat didaftarkan sehingga data- | Program dapat dijalankan dan pengguna dapat melakukan registrasi di dalam aplikasi. |



|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           |   | <p>data tersebut dapat digunakan saat login ke aplikasi</p> <p>f. Login Button : apabila sudah mendaftar maka data tersebut bisa digunakan untuk login</p>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | Login     | ✓ | <p>a. Username : nama user yang sudah terdaftar</p> <p>b. Password : password yang sudah terdaftar sebelumnya</p> <p>c. Button Login : masuk ke dalam aplikasi</p> <p>d. Lupa Password? : apabila lupa password maka password bisa di reset</p> <p>e. Button Register : masuk untuk mendaftarkan akun</p>                       | Program dapat dijalankan sesuai dengan Acceptance Criteria dimana user dapat masuk ke dalam aplikasi                                                                                                                      |
| 3 | Transaksi | ✓ | <p>a. Deposit : sistem dapat secara otomatis mengurangi saldo pelanggan saat melakukan transaksi</p> <p>b. Produk : ketika produk dipilih akan otomatis mengisi data jenis produk dan mempengaruhi harga dari produk yang ditentukan</p> <p>c. Detail Transaksi : sistem dapat mempengaruhi total akhir harga transaksi dan</p> | fitur deposit telah diimplementasikan, sehingga saldo pelanggan otomatis berkurang setiap kali transaksi dilakukan. Selanjutnya, ketika produk dipilih, sistem secara otomatis mengisi data jenis produk dan menyesuaikan |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>dapat memiliki banyak item (produk)</p> <p>d. Struk : struk transaksi memiliki informasi mengenai usaha laundry, harga paket (produk), dan tanggal pengambilan atau pengantaran laundry</p> <p>e. Search : pengguna dapat mencari data menggunakan tanggal dan katakunci</p> <p>f. Date : kolom changeDate di tabel produk di database dapat berubah setiap hari sesuai dengan tanggal saat ini</p> <p>g. Button simpan &amp; cetak : tombol ini berfungsi untuk menyimpan data yang diisi ke database dan juga membuat struk transaksi</p> | <p>harga berdasarkan produk yang dipilih, sehingga memudahkan proses penentuan harga. Pada fitur detail transaksi, sistem dapat menghitung total akhir harga transaksi dengan akurat dan mendukung penambahan banyak item produk dalam satu transaksi. Struk transaksi ini mencakup informasi lengkap mengenai usaha laundry, harga paket atau produk yang dibeli, serta tanggal pengambilan atau pengantaran laundry, memastikan pelanggan mendapatkan rincian yang jelas. Kolom changeDate di tabel produk dalam database juga secara otomatis diperbarui</p> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>setiap hari sesuai dengan tanggal saat ini, memastikan data selalu terkini.</p> <p>Tombol simpan &amp; cetak berfungsi dengan baik untuk menyimpan data yang diisi ke dalam database dan menghasilkan struk transaksi yang dapat dicetak, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan transaksi.</p> |
| 4 | Absensi | ✓ | <p>a. Status : karyawan dinyatakan hadir tepat waktu bila mengakses aplikasi di bawah jam yang telah di tentukan dan terlambat bila di luar jam tersebut</p> <p>b. Informasi jumlah karyawan : menampilkan jumlah karyawan dari total user yang menjabat sebagai karyawan</p> <p>c. Informasi jumlah kehadiran : menampilkan jumlah karyawan yang berstatus tepat waktu maupun</p> | <p>Fitur kehadiran karyawan telah selesai dikerjakan. Kini, status kehadiran karyawan dapat ditentukan secara otomatis berdasarkan waktu akses aplikasi. Karyawan dianggap hadir tepat waktu jika mereka mengakses aplikasi sebelum waktu yang</p>                                                               |

|   |        |   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |   | terlambat                                                                                                                            | <p>telah ditentukan, dan dianggap terlambat jika mengakses di luar jam tersebut. Selain itu, fitur ini juga menyediakan informasi jumlah karyawan yang terdaftar, dengan menampilkan total user yang menjabat sebagai karyawan. Informasi jumlah kehadiran juga telah tersedia, memperlihatkan jumlah karyawan yang hadir tepat waktu dan yang terlambat. Semua data ini disajikan secara real-time untuk memudahkan pemantauan dan pengelolaan kehadiran karyawan.</p> |
| 5 | Produk | ✓ | <p>a. Tambah produk : menambahkan produk ke dalam daftar produk</p> <p>b. Pengaturan harga : mengatur harga dari produk tersebut</p> | <p>Fitur untuk produk telah selesai dikerjakan. Sekarang, produk dapat ditambahkan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |   | c. Jenis Produk : menyesuaikan dengan jenis dari produk tersebut                                                                                                                                                                                         | ke dalam daftar dengan mudah. Selain itu, fitur pengaturan harga memungkinkan penyesuaian harga untuk setiap produk yang terdaftar. Jenis produk juga dapat disesuaikan sesuai dengan kategori atau tipe produk tersebut. Semua fitur ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan inventaris dan memastikan bahwa informasi produk selalu akurat dan up-to-date. |
| 6 | Laporan Keangan | ✓ | <p>a. Auto Create Data by Day : otomatis membuat data setiap hari</p> <p>b. Download : mendownload laporan bulanan</p> <p>c. Change Data : dapat mengubah data secara real-time dengan kondisi mengambil data dari table lain pada tanggal yang sama</p> | <p>Fitur laporan keuangan telah selesai dikerjakan. Fitur Auto Create Data by Day kini memungkinkan pembuatan data keuangan otomatis setiap hari. Fitur Download</p>                                                                                                                                                                                            |

|   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | memudahkan pengunduhan laporan bulanan. Selain itu, fitur Change Data memungkinkan perubahan data secara real-time dengan mengambil data dari tabel lain pada tanggal yang sama. Semua fitur ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan laporan keuangan harian dan bulanan. |
| 7 | User | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Username : username yang digunakan saat mengakses aplikasi</li> <li>b. Email : akun email yang digunakan pada perangkat</li> <li>c. Password : menggunakan kata sandi untuk keamanan akun</li> <li>d. Jabatan : peran dalam usaha yang memiliki</li> <li>e. Add RFID : menambahkan kode RFID di menu user</li> <li>f. Edit Profile : melakukan edit</li> </ul> | Fitur user telah selesai dikerjakan. Sekarang, user dapat mengelola username yang digunakan untuk mengakses aplikasi dan memastikan akun mereka aman dengan kata sandi. Selain itu, user dapat menambahkan akun email yang                                                                           |

|  |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | pada data profil user | <p>digunakan pada perangkat, mengatur peran atau jabatan mereka dalam usaha, dan menambahkan kode RFID di menu user. Fitur Edit Profile juga memungkinkan user untuk mengedit data profil mereka dengan mudah. Semua fitur ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan aplikasi.</p> |
|--|--|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.4 Jadwal Proyek

Tabel 2.2 Jadwal Proyek

| No. | Gugus Tugas ( <i>Task</i> ) Proyek                                              | Durasi (Hari) | Mulai      | Selesai    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 1.  | Inisiasi Proyek                                                                 | 2             | 12-01-2024 | 13-01-2024 |
| 1.1 | Identifikasi stakeholder                                                        | 1             | 12-01-2024 | 13-01-2024 |
| 1.2 | Pembentukan tim proyek :<br>Product Owner, Scrum<br>Master, dan Dev Team        | 1             | 12-01-2024 | 13-01-2024 |
| 1.3 | Penyusunan tujuan proyek                                                        | 1             | 12-01-2024 | 13-01-2024 |
| 1.4 | Persiapan dokumen dan SOP                                                       | 1             | 14-01-2024 | 14-01-2024 |
| 2.  | Design Sprint                                                                   | 5             | 15-01-2024 | 19-01-2024 |
| 2.1 | Understanding                                                                   | 1             | 15-01-2024 | 15-01-2024 |
| 2.2 | Diverging                                                                       | 1             | 16-01-2024 | 16-01-2024 |
| 2.3 | Deciding                                                                        | 1             | 17-01-2024 | 17-01-2024 |
| 2.4 | Prototyping                                                                     | 1             | 18-01-2024 | 18-01-2024 |
| 2.5 | Validating                                                                      | 1             | 19-01-2024 | 19-01-2024 |
| 3.  | Product Backlog                                                                 | 1             | 21-02-2024 | 21-02-2024 |
| 3.1 | Menentukan Sprint Goal,<br>Menyusun Product Backlog<br>dan memilih item Backlog | 1             | 21-02-2024 | 21-02-2024 |
| 4.  | Inkremen 1                                                                      | 10            | 22-03-2024 | 01-04-2024 |
| 4.1 | Sprint Planning, Sprint<br>Backlog, dan Sprint Goal                             | 1             | 22-03-2024 | 22-03-2024 |
| 4.2 | Daily Scrum dan Inkremen                                                        | 5             | 22-03-2024 | 26-03-2024 |
| 4.3 | Sprint Review, Backlog<br>Refinement dan Sprint<br>Retrospective                | 7             | 22-03-2024 | 26-03-2024 |
| 5.  | Inkremen 2                                                                      | 10            | 05-04-2024 | 15-04-2024 |
| 5.1 | Sprint Planning, Sprint<br>Backlog, dan Sprint Goal                             | 1             | 05-04-2024 | 05-04-2024 |



|      |                                                            |     |            |            |
|------|------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| 5.2  | Daily Scrum dan Inkremen                                   | 5   | 05-04-2024 | 10-04-2024 |
| 5.3  | Sprint Review, Backlog Refinement dan Sprint Retrospective | 7   | 05-04-2024 | 12-04-2024 |
| 6.   | Inkremen 3                                                 | 10  | 19-04-2024 | 29-04-2024 |
| 6.1  | Sprint Planning, Sprint Backlog, dan Sprint Goal           | 1   | 19-04-2024 | 19-04-2024 |
| 6.2  | Daily Scrum dan Inkremen                                   | 5   | 19-04-2024 | 24-04-2024 |
| 6.3  | Sprint Review, Backlog Refinement dan Sprint Retrospective | 7   | 19-04-2024 | 26-04-2024 |
| 7.   | Uji Coba dan Validasi                                      | 1   | 26-05-2024 | 27-05-2024 |
| 7.1  | Mengumpulkan umpan balik                                   | 1   | 28-05-2024 | 28-05-2024 |
| 8.   | Perilisan dan Instalasi                                    | 1   | 12-06-2024 | 12-06-2024 |
| 8.1  | Penyesuaian perangkat lunak dengan infrastruktur yang ada  | 2   | 12-06-2024 | 14-06-2024 |
| 9.   | Pelatihan                                                  | 1   | 14-06-2024 | 14-06-2024 |
| 9.1  | Melakukan pelatihan kepada pengguna                        | 1   | 14-06-2024 | 14-06-2024 |
| 10.  | Administrasi                                               | 176 | 06-01-2024 | 30-06-2024 |
| 10.1 | Administrasi dan Dokumentasi                               | 176 | 06-01-2024 | 30-06-2024 |
| 11.  | Pemeliharaan                                               | 7   | 23-06-2024 | 30-06-2024 |
| 11.1 | Penyesuaian sistem                                         | 7   | 23-06-2024 | 30-06-2024 |

## BAB III

### PELAKSANAAN PROYEK

#### 3.1 Design Sprint

Nama Proyek : Visimala Desktop

Manajer Proyek : Willy Adimastha Nugroho

Bidang : Teknologi Informasi

Tanggal : 15-01-2024

Tabel 3.1 Understanding

| <i><b>Understanding</b></i>                                                                                         |                                           |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>                   |                                           |                                            |
| Sesuai dengan <i>scope</i> , tidak sesuai dengan jadwal <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span> |                                           |                                            |
| Tidak sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>             |                                           |                                            |
| Alasan, jika tidak sesuai :                                                                                         |                                           |                                            |
|                                                                                                                     |                                           |                                            |
| Pengadaan Biaya : Rp 50.000,00                                                                                      |                                           |                                            |
| Sesuai Anggaran <input type="checkbox"/>                                                                            | Dibawah Anggaran <input type="checkbox"/> | Melebihi Anggaran <input type="checkbox"/> |
| Catatan Tambahan :                                                                                                  |                                           |                                            |
|                                                                                                                     |                                           |                                            |
| <i><b>Diverging</b></i>                                                                                             |                                           |                                            |
| Sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>                   |                                           |                                            |
| Sesuai dengan <i>scope</i> , tidak sesuai dengan jadwal <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span> |                                           |                                            |
| Tidak sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>             |                                           |                                            |

|                                          |                                           |                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Alasan, jika tidak sesuai :              |                                           |                                            |
|                                          |                                           |                                            |
| Pengadaan Biaya : Rp 50.000,00           |                                           |                                            |
| Sesuai Anggaran <input type="checkbox"/> | Dibawah Anggaran <input type="checkbox"/> | Melebihi Anggaran <input type="checkbox"/> |
| Catatan Tambahan :                       |                                           |                                            |
|                                          |                                           |                                            |

Tabel 3.2 Deciding

| <b><i>Deciding</i></b>                                  |                                           |                                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                   | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Sesuai dengan <i>scope</i> , tidak sesuai dengan jadwal | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Tidak sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal             | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Alasan, jika tidak sesuai :                             |                                           |                                            |
|                                                         |                                           |                                            |
| Pengadaan Biaya : Rp 20.000,00                          |                                           |                                            |
| Sesuai Anggaran <input type="checkbox"/>                | Dibawah Anggaran <input type="checkbox"/> | Melebihi Anggaran <input type="checkbox"/> |
| Catatan Tambahan :                                      |                                           |                                            |
|                                                         |                                           |                                            |
| <b><i>Prototyping</i></b>                               |                                           |                                            |
| Sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                   | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Sesuai dengan <i>scope</i> , tidak sesuai dengan jadwal | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Tidak sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal             | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Alasan, jika tidak sesuai :                             |                                           |                                            |
|                                                         |                                           |                                            |
| Pengadaan Biaya : Rp 100.000,00                         |                                           |                                            |
| Sesuai Anggaran <input type="checkbox"/>                | Dibawah Anggaran <input type="checkbox"/> | Melebihi Anggaran <input type="checkbox"/> |

|                    |
|--------------------|
| Catatan Tambahan : |
|--------------------|

Tabel 3.3 Validating

| <b>Validating</b>                                       |                                           |                                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                   | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Sesuai dengan <i>scope</i> , tidak sesuai dengan jadwal | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Tidak sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal             | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Alasan, jika tidak sesuai :                             |                                           |                                            |
|                                                         |                                           |                                            |
| Pengadaan Biaya : Rp 20.000,00                          |                                           |                                            |
| Sesuai Anggaran <input type="checkbox"/>                | Dibawah Anggaran <input type="checkbox"/> | Melebihi Anggaran <input type="checkbox"/> |
| Catatan Tambahan :                                      |                                           |                                            |
|                                                         |                                           |                                            |

### 3.2 Product Backlog

Nama Proyek : Visimala Desktop

Manajer Proyek : Willy Adimastha Nugroho

Bidang : Teknologi Informasi

Tanggal : 21-03-2024

Tabel 3.4 Product Backlog

| <b>Product Backlog</b>                                  |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                   | <input type="checkbox"/> |
| Sesuai dengan <i>scope</i> , tidak sesuai dengan jadwal | <input type="checkbox"/> |
| Tidak sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal             | <input type="checkbox"/> |

|                                          |                                           |                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Alasan, jika tidak sesuai :              |                                           |                                            |
|                                          |                                           |                                            |
| Pengadaan Biaya : Rp 75.000,00           |                                           |                                            |
| Sesuai Anggaran <input type="checkbox"/> | Dibawah Anggaran <input type="checkbox"/> | Melebihi Anggaran <input type="checkbox"/> |
| Catatan Tambahan :                       |                                           |                                            |
|                                          |                                           |                                            |

### 3.3 Inkremen 1

Nama Proyek : Visimala Desktop

Manajer Proyek : Willy Adimastha Nugroho

Bidang : Teknologi Informasi

Tanggal : 22-03-2024

Tabel 3.5 Sprint Planning Inkremen 1

| <b><i>Sprint Planning, Sprint Backlog, Sprint Goal</i></b>                                  |                                           |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                                                       | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Sesuai dengan <i>scope</i> , tidak sesuai dengan jadwal                                     | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Tidak sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                                                 | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Alasan, jika tidak sesuai : masalah pada manajemen waktu, masalah teknis dan manajemen tim. |                                           |                                            |
|                                                                                             |                                           |                                            |
| Pengadaan Biaya : Rp 135.000,00                                                             |                                           |                                            |
| Sesuai Anggaran <input type="checkbox"/>                                                    | Dibawah Anggaran <input type="checkbox"/> | Melebihi Anggaran <input type="checkbox"/> |
| Catatan Tambahan : perlu solusi untuk memecahkan masalah kesalahan kode program.            |                                           |                                            |
|                                                                                             |                                           |                                            |
| <b><i>Daily Scrum</i></b>                                                                   |                                           |                                            |
| Sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                                                       | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Sesuai dengan <i>scope</i> , tidak sesuai dengan jadwal                                     | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Tidak sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                                                 | <input type="checkbox"/>                  |                                            |

|                                                                                            |                                           |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Alasan, jika tidak sesuai : kendala selama pengerjaan dan masalah kode program pada fitur. |                                           |                                            |
| Pengadaan Biaya : Rp 20.000,00                                                             |                                           |                                            |
| Sesuai Anggaran <input type="checkbox"/>                                                   | Dibawah Anggaran <input type="checkbox"/> | Melebihi Anggaran <input type="checkbox"/> |
| Catatan Tambahan :                                                                         |                                           |                                            |

Tabel 3.6 Sprint Review Inkremen 1

| <b><i>Sprint Review, Backlog Refinement, Sprint Retrospective</i></b>                 |                                           |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                                                 | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Sesuai dengan <i>scope</i> , tidak sesuai dengan jadwal                               | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Tidak sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                                           | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Alasan, jika tidak sesuai : menyesuaikan logika dan kode program pada fitur aplikasi. |                                           |                                            |
| Pengadaan Biaya : Rp 20.000,00                                                        |                                           |                                            |
| Sesuai Anggaran <input type="checkbox"/>                                              | Dibawah Anggaran <input type="checkbox"/> | Melebihi Anggaran <input type="checkbox"/> |
| Catatan Tambahan :                                                                    |                                           |                                            |

### 3.4 Inkremen 2

Nama Proyek : Visimala Desktop

Manajer Proyek : Willy Adimastha Nugroho

Bidang : Teknologi Informasi

Tanggal : 05-04-2024

Tabel 3.7 Sprint Planning Inkremen 2

| <b><i>Sprint Planning, Sprint Backlog, Sprint Goal</i></b>                                                                                       |                                           |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Sesuai dengan <i>scope</i> , tidak sesuai dengan jadwal                                                                                          | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Tidak sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Alasan, jika tidak sesuai : terdapat kesulitan selama pengerjaan fitur aplikasi, perubahan pada konten, hingga adaptasi dari perubahan tersebut. |                                           |                                            |
| Pengadaan Biaya : Rp 125.000,00                                                                                                                  |                                           |                                            |
| Sesuai Anggaran <input type="checkbox"/>                                                                                                         | Dibawah Anggaran <input type="checkbox"/> | Melebihi Anggaran <input type="checkbox"/> |
| Catatan Tambahan :                                                                                                                               |                                           |                                            |
| <b><i>Daily Scrum</i></b>                                                                                                                        |                                           |                                            |
| Sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Sesuai dengan <i>scope</i> , tidak sesuai dengan jadwal                                                                                          | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Tidak sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Alasan, jika tidak sesuai : penundaan dikarenakan waktu pengerjaan yang lebih lama.                                                              |                                           |                                            |
| Pengadaan Biaya : Rp 20.000,00                                                                                                                   |                                           |                                            |
| Sesuai Anggaran <input type="checkbox"/>                                                                                                         | Dibawah Anggaran <input type="checkbox"/> | Melebihi Anggaran <input type="checkbox"/> |
| Catatan Tambahan :                                                                                                                               |                                           |                                            |

Tabel 3.8 Sprint Review Inkremen 2

| <b><i>Sprint Review, Backlog Refinement, Sprint Retrospective</i></b>                                                                                                                             |                                           |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                                                                                                                                                             |                                           | <input type="checkbox"/>                   |
| Sesuai dengan <i>scope</i> , tidak sesuai dengan jadwal                                                                                                                                           |                                           | <input type="checkbox"/>                   |
| Tidak sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                                                                                                                                                       |                                           | <input type="checkbox"/>                   |
| Alasan, jika tidak sesuai : penyesuaian terhadap perubahan yang diminta dari stakeholder dan kompleksitas tugas yang diberikan membuat durasi kerja lebih lama dari jadwal yang telah ditetapkan. |                                           |                                            |
| Pengadaan Biaya : Rp 20.000,00                                                                                                                                                                    |                                           |                                            |
| Sesuai Anggaran <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                          | Dibawah Anggaran <input type="checkbox"/> | Melebihi Anggaran <input type="checkbox"/> |
| Catatan Tambahan :                                                                                                                                                                                |                                           |                                            |



### 3.5 Inkremen 3

Nama Proyek : Visimala Desktop

Manajer Proyek : Willy Adimastha Nugroho

Bidang : Teknologi Informasi

Tanggal : 19-04-2024

Tabel 3.9 Sprint Planning Inkremen 3

| <b><i>Sprint Planning, Sprint Backlog, Sprint Goal</i></b>                                                                         |                                           |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                                                                                              | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Sesuai dengan <i>scope</i> , tidak sesuai dengan jadwal                                                                            | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Tidak sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                                                                                        | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Alasan, jika tidak sesuai : penambahan fitur yang menyebabkan penambahan beban kerja membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaan. |                                           |                                            |
| Pengadaan Biaya : Rp 275.000,00                                                                                                    |                                           |                                            |
| Sesuai Anggaran <input type="checkbox"/>                                                                                           | Dibawah Anggaran <input type="checkbox"/> | Melebihi Anggaran <input type="checkbox"/> |
| Catatan Tambahan :                                                                                                                 |                                           |                                            |
| <b><i>Daily Scrum</i></b>                                                                                                          |                                           |                                            |
| Sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                                                                                              | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Sesuai dengan <i>scope</i> , tidak sesuai dengan jadwal                                                                            | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Tidak sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                                                                                        | <input type="checkbox"/>                  |                                            |
| Alasan, jika tidak sesuai : kurangnya fokus terhadap tugas yang diberikan.                                                         |                                           |                                            |
| Pengadaan Biaya : Rp 50.000,00                                                                                                     |                                           |                                            |
| Sesuai Anggaran <input type="checkbox"/>                                                                                           | Dibawah Anggaran <input type="checkbox"/> | Melebihi Anggaran <input type="checkbox"/> |
| Catatan Tambahan :                                                                                                                 |                                           |                                            |

Tabel 3.10 Sprint Review Inkremen 3

| <b><i>Sprint Review, Backlog Refinement, Sprint Retrospective</i></b>                                                       |                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                                                                                       |                                           | <input type="checkbox"/>                   |
| Sesuai dengan <i>scope</i> , tidak sesuai dengan jadwal                                                                     |                                           | <input type="checkbox"/>                   |
| Tidak sesuai dengan <i>scope</i> dan jadwal                                                                                 |                                           | <input type="checkbox"/>                   |
| Alasan, jika tidak sesuai: tindakan perbaikan dari retrospective sebelumnya belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik. |                                           |                                            |
| Pengadaan Biaya : Rp 50.000,00                                                                                              |                                           |                                            |
| Sesuai Anggaran <input type="checkbox"/>                                                                                    | Dibawah Anggaran <input type="checkbox"/> | Melebihi Anggaran <input type="checkbox"/> |
| Catatan Tambahan :                                                                                                          |                                           |                                            |

## BAB IV

### KONTROL PROYEK DAN HASIL PENGUJIAN PBI

#### 4.1 Project Management Plan

Dokumen ini berperan sebagai panduan dalam mengendalikan suatu proyek. Jika Project Management Plan memuat rincian mengenai perencanaan proyek, maka Project Controlling adalah proses pengendalian terhadap pelaksanaan rencana tersebut.

#### 4.2 Catatan Pertemuan/Rapat Ke-1

Nama Proyek : Visimala Desktop

Manajer Proyek : Willy Adimastha Nugroho

Perihal : Rapat Pembukaan Proyek Visimala Desktop

Peserta Rapat : Stakeholder, Pemilik Proyek/Product Owner, Manajer Proyek/Scrum Master dan Tim Pengembang

Lokasi Rapat : Gedung JTI

Dibuat oleh : Willy Adimastha Nugroho

Tanggal : 09-01-2024

##### A. Agenda

Rapat **Pembukaan Proyek** Visimala Desktop :

1. *Overview* proyek
2. Pengenalan semua tim yang terlibat dalam proyek
3. Penjelasan mekanisme pelaksanaan proyek, termasuk *Design Sprint* dan *Scrum*
4. Pembahasan manajemen komunikasi tim proyek

##### B. Isu Yang Didiskusikan

1. Pembahasan struktur organisasi proyek
2. Pembahasan *scope*, *time*, dan *cost* proyek
3. Pemantapan pembagian task (pekerjaan) dan wewenang sesuai dengan konsep *Scrum*
4. Mekanisme *meeting*
5. Jam kerja tim proyek.

Tabel 4.1 Daftar Rencana Proyek

| <b>C. Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya</b>  |              |                |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Rencana Kegiatan</b>                       | <b>Mulai</b> | <b>Selesai</b> |
| 1. Persiapan pelaksanaan <i>Design Sprint</i> | 09-01-2024   | 14-01-2024     |
| 2. Monitoring hasil <i>Design Sprint</i>      | 14-01-2024   | 14-01-2024     |

| <b>Dibuat oleh</b>                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Willy Adimastha Nugroho<br>Jabatan : Manajer Proyek<br>Tanggal : 09-01-2024 |

| <b>Disetujui oleh</b>                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Satria Ardiantha Uno<br>Jabatan : Pemilik Proyek<br>Tanggal : 09-01-2024 |

### 4.3 Catatan Pertemuan Rapat Ke-2

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Nama Proyek    | : Visimala Desktop                                   |
| Manajer Proyek | : Willy Adimastha Nugroho                            |
| Perihal        | : Rapat Reguler Design Sprint                        |
| Peserta Rapat  | : Pemilik Proyek, Manajer Proyek, dan Tim Pengembang |
| Lokasi Rapat   | : Gedung JTI                                         |
| Dibuat oleh    | : Willy Adimastha Nugroho                            |
| Tanggal        | : 14-01-2024                                         |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Agenda</b>                                                           |
| 1. Monitoring hasil <i>Design Sprint</i>                                   |
| 2. Penentuan prototipe produk sistem informasi penilaian kinerja siswa PKL |
| <b>B. Isu Yang Didiskusikan</b>                                            |
| 1. Memvalidasi hasil prototipe produk yang telah dirumuskan                |
| 2. Mempersiapkan pembentukan <i>Product Backlog</i>                        |

Tabel 4.2 Daftar Rencana Kegiatan

| C. Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya           |            |            |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Rencana Kegiatan                                | Mulai      | Selesai    |
| 1. Persiapan pelaksanaan <i>Product Backlog</i> | 15-01-2024 | 19-01-2024 |

| Dibuat oleh                    |
|--------------------------------|
| Nama : Willy Adimastha Nugroho |
| Jabatan : Manajer Proyek       |
| Tanggal : 14-01-2024           |

| Disetujui oleh              |
|-----------------------------|
| Nama : Satria Ardiantha Uno |
| Jabatan : Pemilik Proyek    |
| Tanggal : 14-01-2024        |

#### 4.4 Catatan Pertemuan Rapat Ke-3

Nama Proyek : Visimala Desktop

Manajer Proyek : Willy Adimastha Nugroho

Perihal : Rapat Reguler Product Backlog

Peserta Rapat : Pemilik Proyek, Manajer Proyek, dan Tim Pengembang

Lokasi Rapat : Gedung JTI

Dibuat oleh : Willy Adimastha Nugroho

Tanggal : 19-02-2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>A. Agenda</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan <i>Product Backlog</i></li> <li>2. Pembagian Inkremen <i>Scrum</i></li> </ol> <p><b>B. Isu Yang Didiskusikan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Product Backlog dari hasil prototipe produk yang telah di validasipada <i>Design Sprint</i></li> <li>2. Memberikan prioritas <i>item Product Backlog</i></li> <li>3. Mempersiapkan penyusunan Inkremen <i>Scrum</i></li> </ol> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 4.3 Daftar Rencana Kegiatan

| <b>C. Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya</b> |              |                |
|----------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Rencana Kegiatan</b>                      | <b>Mulai</b> | <b>Selesai</b> |
| 1. Persiapan pelaksanaan Inkremen 1          | 21-02-2024   | 21-02-2024     |

| <b>Dibuat oleh</b>                                                                 | <b>Disetujui oleh</b>                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Willy Adimastha Nugroho<br>Jabatan : Manajer Proyek<br>Tanggal : 19-02-2024 | Nama : Satria Ardiantha Uno<br>Jabatan : Pemilik Proyek<br>Tanggal : 19-02-2024 |

#### 4.5 Catatan Pertemuan Rapat Ke-4

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Nama Proyek    | : Visimala Desktop                                   |
| Manajer Proyek | : Willy Adimastha Nugroho                            |
| Perihal        | : Rapat Reguler Sprint Planning Inkremen 1           |
| Peserta Rapat  | : Pemilik Proyek, Manajer Proyek, dan Tim Pengembang |
| Lokasi Rapat   | : Gedung JTI                                         |
| Dibuat oleh    | : Willy Adimastha Nugroho                            |
| Tanggal        | : 22-03-2024                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>A. Agenda</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan <i>Product Backlog</i></li> <li>2. Pembagian Inkremen <i>Scrum</i></li> </ol> <p><b>B. Isu Yang Didiskusikan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan <i>item Product Backlog</i> menjadi <i>Sprint Backlog</i></li> <li>2. Pembagian tugas antar Tim Pengembang sesuai dengan <i>Sprint Backlog</i> yang telah disusun</li> <li>3. Penentuan <i>Sprint Goal</i></li> <li>4. Penentuan durasi <i>Sprint</i> dan persiapan <i>Daily Sprint</i> dari Inkremen 1</li> </ol> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 4.4 Daftar Rencana Kegiatan

| <b>C. Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya</b>                                   |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Rencana Kegiatan</b>                                                        | <b>Mulai</b> | <b>Selesai</b> |
| 1. Persiapan pelaksanaan Inkremen 1                                            | 22-03-2024   | 22-03-2024     |
| 2. Pelaksanaan <i>Sprint Review</i> dan <i>Sprint Retrospective</i> Inkremen 1 | 22-03-2024   | 26-03-2024     |

| <b>Dibuat oleh</b>                                                                 | <b>Disetujui oleh</b>                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Willy Adimastha Nugroho<br>Jabatan : Manajer Proyek<br>Tanggal : 22-03-2024 | Nama : Satria Ardiantha Uno<br>Jabatan : Pemilik Proyek<br>Tanggal : 22-03-2024 |

#### 4.6 Catatan Pertemuan Rapat Ke-5

Nama Proyek : Visimala Desktop

Manajer Proyek : Willy Adimastha Nugroho

Perihal : Rapat Reguler hasil Inkremen 1

Peserta Rapat : Pemilik Proyek, Manajer Proyek, dan Tim Pengembang

Lokasi Rapat : Gedung JTI

Dibuat oleh : Willy Adimastha Nugroho

Tanggal : 26-03-2024

##### A. Agenda

1. Demonstrasi hasil pelaksanaan *Sprint Backlog*
2. Perubahan *Product Backlog* (jika diperlukan)

##### B. Isu Yang Didiskusikan

1. Penjelasan *item Product Backlog* apa yang sudah "Selesai" dan apa yang belum "Selesai"
2. Masalah yang dihadapi Tim Pengembang dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut
3. Demonstrasi hasil Inkremen 1
4. Keadaan terakhir *Product Backlog*
5. Masukan pelaksanaan *Sprint Planning* berikutnya

Tabel 4.5 Daftar Rencana Kegiatan

| <b>C. Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya</b>               |              |                |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Rencana Kegiatan</b>                                    | <b>Mulai</b> | <b>Selesai</b> |
| 1. Persiapan pelaksanaan <i>Sprint Planning</i> Inkremen 2 | 26-03-2024   | 26-03-2024     |

| <b>Dibuat oleh</b>                                                                 | <b>Disetujui oleh</b>                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Willy Adimastha Nugroho<br>Jabatan : Manajer Proyek<br>Tanggal : 26-03-2024 | Nama : Satria Ardiantha Uno<br>Jabatan : Pemilik Proyek<br>Tanggal : 26-03-2024 |

#### 4.7 Catatan Pertemuan Rapat Ke-6

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Nama Proyek    | : Visimala Desktop                                   |
| Manajer Proyek | : Willy Adimastha Nugroho                            |
| Perihal        | : Rapat Sprint Planning Inkremen 2                   |
| Peserta Rapat  | : Pemilik Proyek, Manajer Proyek, dan Tim Pengembang |
| Lokasi Rapat   | : Gedung JTI                                         |
| Dibuat oleh    | : Willy Adimastha Nugroho                            |
| Tanggal        | : 05-04-2024                                         |

##### **A. Agenda**

1. Penyusunan *Sprint Backlog* dan *Sprint Goal*
2. Persiapan pelaksanaan *Daily Sprint* Inkremen 2

##### **B. Isu Yang Didiskusikan**

1. Pemilihan *item Product Backlog* menjadi *Sprint Backlog*
2. Pembagian tugas antar Tim Pengembang sesuai dengan *Sprint Backlog* yangtelah disusun
3. Penentuan *Sprint Goal*
4. Penentuan durasi *Sprint* dan persiapan *Daily Sprint* dari Inkremen 2



Tabel 4.6 Daftar Rencana Kegiatan

| <b>C. Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya</b>                                   |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Rencana Kegiatan</b>                                                        | <b>Mulai</b> | <b>Selesai</b> |
| 1. Persiapan pelaksanaan <i>Sprint</i> Inkremen 2                              | 05-04-2024   | 05-04-2024     |
| 2. Pelaksanaan <i>Sprint Review</i> dan <i>Sprint Retrospective</i> Inkremen 2 | 05-04-2024   | 12-04-2024     |

| <b>Dibuat oleh</b>                                                                 | <b>Disetujui oleh</b>                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Willy Adimastha Nugroho<br>Jabatan : Manajer Proyek<br>Tanggal : 05-04-2024 | Nama : Satria Ardiantha Uno<br>Jabatan : Pemilik Proyek<br>Tanggal : 05-04-2024 |

#### 4.8 Catatan Pertemuan Rapat Ke-7

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Nama Proyek    | : Visimala Desktop                                   |
| Manajer Proyek | : Willy Adimastha Nugroho                            |
| Perihal        | : Rapat Reguler hasil Inkremen 2                     |
| Peserta Rapat  | : Pemilik Proyek, Manajer Proyek, dan Tim Pengembang |
| Lokasi Rapat   | : Gedung JTI                                         |
| Dibuat oleh    | : Willy Adimastha Nugroho                            |
| Tanggal        | : 12-04-2024                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>A. Agenda</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Demonstrasi hasil pelaksanaan <i>Sprint Backlog</i></li> <li>2. Perubahan <i>Product Backlog</i> (jika diperlukan)</li> <li>3. Persiapan <i>Sprint Planning</i> berikutnya</li> </ol> <p><b>B. Isu Yang Didiskusikan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan <i>item Product Backlog</i> apa yang sudah “Selesai” dan apa yang belum “Selesai”</li> <li>2. Masalah yang dihadapi Tim Pengembang dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut</li> <li>3. Demonstrasi hasil Inkremen 2</li> <li>4. Keadaan terakhir <i>Product Backlog</i></li> <li>5. Masukan pelaksanaan <i>Sprint Planning</i> berikutnya</li> </ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 4.7 Daftar Rencana Kegiatan

| <b>C. Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya</b>               |              |                |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Rencana Kegiatan</b>                                    | <b>Mulai</b> | <b>Selesai</b> |
| 1. Persiapan pelaksanaan <i>Sprint Planning</i> Inkremen 3 | 12-04-2024   | 12-04-2024     |

| <b>Dibuat oleh</b>                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Willy Adimastha<br>Nugroho<br>Jabatan : Manajer Proyek<br>Tanggal : 12-04-2024 |

| <b>Disetujui oleh</b>                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Satria Ardiantha Uno<br>Jabatan : Pemilik Proyek<br>Tanggal : 12-04-2024 |

#### 4.9 Catatan Pertemuan Rapat Ke-8

Nama Proyek : Visimala Desktop

Manajer Proyek : Willy Adimastha Nugroho

Perihal : Rapat Sprint Planning Inkremen 3

Peserta Rapat : Pemilik Proyek, Manajer Proyek, dan Tim Pengembang

Lokasi Rapat : Gedung JTI

Dibuat oleh : Willy Adimastha Nugroho

Tanggal : 19-04-2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>A. Agenda</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan <i>Sprint Backlog</i> dan <i>Sprint Goal</i></li> <li>2. Persiapan pelaksanaan <i>Daily Sprint</i> Inkremen 3</li> </ol> <p><b>B. Isu Yang Didiskusikan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan <i>item Product Backlog</i> menjadi <i>Sprint Backlog</i></li> <li>2. Pembagian tugas antar Tim Pengembang sesuai dengan <i>Sprint Backlog</i> yang telah disusun</li> <li>3. Penentuan <i>Sprint Goal</i></li> <li>4. Penentuan durasi <i>Sprint</i> dan persiapan <i>Daily Sprint</i> dari Inkremen 3</li> </ol> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 4.8 Daftar Rencana Kegiatan

| <b>C. Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya</b>                                   |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Rencana Kegiatan</b>                                                        | <b>Mulai</b> | <b>Selesai</b> |
| 1. Persiapan pelaksanaan <i>Sprint</i> Inkremen 3                              | 19-04-2024   | 19-04-2024     |
| 2. Pelaksanaan <i>Sprint Review</i> dan <i>Sprint Retrospective</i> Inkremen 3 | 19-04-2024   | 26-04-2024     |

| <b>Dibuat oleh</b>                                                                 | <b>Disetujui oleh</b>                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Willy Adimastha Nugroho<br>Jabatan : Manajer Proyek<br>Tanggal : 19-04-2024 | Nama : Satria Ardiantha Uno<br>Jabatan : Pemilik Proyek<br>Tanggal : 19-04-2024 |

#### 4.10 Catatan Pertemuan Rapat Ke-9

Nama Proyek : Visimala Desktop

Manajer Proyek : Willy Adimastha Nugroho

Perihal : Rapat Reguler hasil Inkremen 3

Peserta Rapat : Pemilik Proyek, Manajer Proyek, dan Tim Pengembang

Lokasi Rapat : Gedung JTI

Dibuat oleh : Willy Adimastha Nugroho

Tanggal : 26-04-2024

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Agenda</b>                                                                            |
| 1. Demonstrasi hasil pelaksanaan <i>Sprint Backlog</i>                                      |
| <b>B. Isu Yang Didiskusikan</b>                                                             |
| 1. Penjelasan <i>item Product Backlog</i> apa yang sudah “Selesai”                          |
| 2. Masalah yang dihadapi Tim Pengembang dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut |
| 3. Demonstrasi hasil Inkremen 3                                                             |
| 4. Keadaan terakhir <i>Product Backlog</i>                                                  |

Tabel 4.9 Daftar Rencana Kegiatan

| <b>C. Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya</b> |              |                |
|----------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Rencana Kegiatan</b>                      | <b>Mulai</b> | <b>Selesai</b> |
| 1. Persiapan penutupan proyek                | 26-04-2024   | 26-04-2024     |

| <b>Dibuat oleh</b>                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Willy Adimastha<br>Nugroho<br>Jabatan : Manajer Proyek<br>Tanggal : 26-04-2024 |

| <b>Disetujui oleh</b>                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Satria Ardiantha Uno<br>Jabatan : Pemilik Proyek<br>Tanggal : 26-04-2024 |

#### 4.11 Catatan Pertemuan Rapat Ke-10

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Nama Proyek    | : Visimala Desktop                                   |
| Manajer Proyek | : Willy Adimastha Nugroho                            |
| Perihal        | : Rapat Penutupan Proyek                             |
| Peserta Rapat  | : Pemilik Proyek, Manajer Proyek, dan Tim Pengembang |
| Lokasi Rapat   | : Gedung JTI                                         |
| Dibuat oleh    | : Willy Adimastha Nugroho                            |
| Tanggal        | : 26-02-2024                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>A. Agenda</b></p> <p>Rapat Penutupan Proyek Pembangunan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Siswa PKL :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian selesainya proyek Visimala Desktop</li> <li>2. Penyampaian pertanggungjawaban manajer proyek kepada pemilik proyek</li> <li>3. Penyampaian pertanggungjawaban pemilik proyek kepada <i>stakeholder</i></li> </ol> <p><b>B. Isu Yang Didiskusikan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penandatanganan semua dokumen Penutupan Proyek</li> <li>2. Pembubaran Tim Proyek</li> </ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 4.10 Daftar Rencana Kegiatan

| <b>C. Daftar Rencana Kegiatan Berikutnya</b> |              |                |
|----------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Rencana Kegiatan</b>                      | <b>Mulai</b> | <b>Selesai</b> |
| 1. Penyesuaian sistem                        | 23-06-2024   | 30-06-2024     |

| <b>Dibuat oleh</b>                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Willy Adimastha<br>Nugroho<br>Jabatan : Manajer Proyek<br>Tanggal : 23-06-2024 |

| <b>Disetujui oleh</b>                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Satria Ardiantha Uno<br>Jabatan : Pemilik Proyek<br>Tanggal : 23-06-2024 |

#### 4.12 Kemajuan Proyek

Berikut merupakan kemajuan proyek selama pembangunan proyek:

##### A. Design Sprint

Nama Proyek : Visimala Desktop  
 Pemilik Proyek : Satria Ardiantha Uno  
 Manajer Proyek : Willy Adimastha Nugroho  
 Periode : 15-01-2024 s.d. 19-01-2024

Tabel 4.11 Kemajuan Proyek Design Sprint

| 1. Status                                              |                     |            |                |            |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|------------|
| Selesai, tidak ada permintaan perubahan/penambahan     |                     |            |                |            |
| 2. Hasil ( <i>Deliverables</i> ) dan <i>Milestones</i> |                     |            |                |            |
| Deskripsi                                              | Tanggal Perencanaan |            | Tanggal Aktual |            |
|                                                        | Mulai               | Selesai    | Mulai          | Selesai    |
| Membuat desain untuk isi untuk akun karyawan           | 15-01-2024          | 19-01-2024 | 15-01-2024     | 19-01-2024 |
|                                                        |                     |            |                |            |
| Perkiraan penambahan durasi (hari) : 0                 |                     |            |                |            |
| Perkiraan biaya untuk menyelesaikan : Rp250.000,00     |                     |            |                |            |

| Dibuat oleh                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Willy Adimastha Nugroho<br>Jabatan : Manajer Proyek<br>Tanggal : 14-01-2024 |

| Disetujui oleh                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Satria Ardiantha Uno<br>Jabatan : Pemilik Proyek<br>Tanggal : 14-01-2024 |

## B. Inkremen 1

Nama Proyek : Visimala Desktop

Pemilik Proyek : Satria Ardiantha Uno

Manajer Proyek : Willy Adimastha Nugroho

Periode : 22-03-2024 s.d. 01-04-2024

Tabel 4.12 Kemajuan Proyek Inkremen 1

| <b>1. Status</b>                                            |                     |            |                |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|------------|
| Selesai, tidak ada permintaan perubahan/penambahan          |                     |            |                |            |
| <b>2. Hasil (<i>Deliverables</i>) dan <i>Milestones</i></b> |                     |            |                |            |
| Deskripsi                                                   | Tanggal Perencanaan |            | Tanggal Aktual |            |
|                                                             | Mulai               | Selesai    | Mulai          | Selesai    |
| Pengerjaan pada menu karyawan dari aplikasi desktop         | 22-03-2024          | 01-04-2024 | 22-03-2024     | 01-04-2024 |
|                                                             |                     |            |                |            |
| Perkiraan penambahan durasi (hari) : 0                      |                     |            |                |            |
| Perkiraan biaya untuk menyelesaikan : Rp200.000,00          |                     |            |                |            |

| <b>Dibuat oleh</b>                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Willy Adimastha Nugroho<br>Jabatan : Manajer Proyek<br>Tanggal : 22-03-2024 |

| <b>Disetujui oleh</b>                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Satria Ardiantha Uno<br>Jabatan : Pemilik Proyek<br>Tanggal : 22-03-2024 |

## C. Inkremen 2

Nama Proyek : Visimala Desktop

Pemilik Proyek : Satria Ardiantha Uno

Manajer Proyek : WillyAdimastha Nugroho

Periode : 05-04-2024 s.d. 15-04-2024

Tabel 4.13 Kemajuan Proyek Inkremen 2

| <b>1. Status</b>                                            |                     |            |                |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|------------|
| Selesai, tidak ada permintaan perubahan/penambahan          |                     |            |                |            |
| <b>2. Hasil (<i>Deliverables</i>) dan <i>Milestones</i></b> |                     |            |                |            |
| Deskripsi                                                   | Tanggal Perencanaan |            | Tanggal Aktual |            |
|                                                             | Mulai               | Selesai    | Mulai          | Selesai    |
| Pengerjaan pada menu owner dari aplikasi desktop            | 05-04-2024          | 15-04-2024 | 05-04-2024     | 15-04-2024 |
|                                                             |                     |            |                |            |
| Perkiraan penambahan durasi (hari) : 0                      |                     |            |                |            |
| Perkiraan biaya untuk menyelesaikan : Rp165.000,00          |                     |            |                |            |

| <b>Dibuat oleh</b>                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Willy Adimastha Nugroho<br>Jabatan : Manajer Proyek<br>Tanggal : 05-04-2024 |

| <b>Disetujui oleh</b>                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Satria Ardiantha Uno<br>Jabatan : Pemilik Proyek<br>Tanggal : 05-04-2024 |



## D. Inkremen 3

Nama Proyek : Visimala Desktop

Pemilik Proyek : Satria Ardiantha Uno

Manajer Proyek : Willy Adimastha Nugroho

Periode : 19-04-2024 s.d. 29-04-2024

Tabel 4.14 Kemajuan Proyek Inkremen 3

| <b>1. Status</b>                                            |                     |            |                |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|------------|
| Selesai, tidak ada permintaan perubahan/penambahan          |                     |            |                |            |
| <b>2. Hasil (<i>Deliverables</i>) dan <i>Milestones</i></b> |                     |            |                |            |
| Deskripsi                                                   | Tanggal Perencanaan |            | Tanggal Aktual |            |
|                                                             | Mulai               | Selesai    | Mulai          | Selesai    |
| Perbaikan dan peningkatan fitur serta desain dari aplikasi  | 19-04-2024          | 29-04-2024 | 19-04-2024     | 29-04-2024 |
|                                                             |                     |            |                |            |
| Perkiraan penambahan durasi (hari) : 0                      |                     |            |                |            |
| Perkiraan biaya untuk menyelesaikan : Rp400.000,00          |                     |            |                |            |

| <b>Dibuat oleh</b>                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Willy Adimastha Nugroho<br>Jabatan : Manajer Proyek<br>Tanggal : 19-04-2024 |

| <b>Disetujui oleh</b>                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nama : Satria Ardiantha Uno<br>Jabatan : Pemilik Proyek<br>Tanggal : 19-04-2024 |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Aplikasi untuk manajemen karyawan dan keuangan menjadi aset penting bagi pemilik bisnis laundry dalam mengelola operasional mereka. Fitur seperti pencatatan absensi dan evaluasi kinerja karyawan akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang produktivitas dan kehadiran staf. Selain itu, kemampuan melacak pengeluaran dan pemasukan secara real-time akan membantu menjaga kesehatan keuangan usaha dalam jangka panjang.

Dengan data yang disimpan secara digital dan dapat diakses dengan cepat melalui sistem informasi, pemilik bisnis dapat memantau kinerja bisnis mereka dengan lebih efisien. Ini memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis untuk pertumbuhan bisnis mereka. Oleh karena itu, pentingnya sistem informasi dalam mendukung bisnis laundry tidak boleh diabaikan.

Dengan penerapan aplikasi ini, pemilik bisnis diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan profitabilitas mereka. Melalui optimalisasi operasional dan peningkatan kualitas layanan, aplikasi ini memberikan nilai tambah yang besar bagi bisnis laundry. Ini membantu mereka untuk bertahan dan berkembang dalam pasar yang semakin kompetitif. Jadi, aplikasi laundry berbasis desktop menjadi solusi yang andal dan terukur bagi pemilik bisnis laundry untuk mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi.

#### **5.2 Saran**

Untuk memaksimalkan manfaat dari aplikasi manajemen karyawan dan keuangan dalam bisnis laundry, ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan. Pertama, pemilik usaha harus melibatkan karyawan dalam penggunaan aplikasi ini. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan yang memadai dan membantu mereka memahami fitur-fitur yang tersedia. Dengan pelatihan yang

tepat, karyawan akan lebih siap memanfaatkan aplikasi secara efektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional.

Selain itu, pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kinerja aplikasi perlu dilakukan untuk memastikan hasil yang optimal. Pemilik usaha harus secara berkala meninjau bagaimana aplikasi digunakan dan apakah fitur-fiturnya memberikan manfaat yang diharapkan. Jika ditemukan kendala atau ketidakefisienan, segera lakukan penyesuaian atau perbaikan untuk memastikan aplikasi terus memberikan hasil yang diinginkan.

Penting juga bagi pemilik usaha untuk terus memperbarui dan mengembangkan fitur-fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka guna memaksimalkan potensi aplikasi. Ini bisa dilakukan dengan berkomunikasi secara aktif dengan pengembang aplikasi untuk menginformasikan kebutuhan atau masukan pengguna. Selain itu, mencari solusi tambahan yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang sudah ada dapat membantu mengoptimalkan fungsionalitas dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi bisnis laundry.
